


FASE 1-1

IMPLANTACIÓN EN OBRA




FASE 1-2

TRABAJOS EN ENTRADA Y DIRECCIÓN

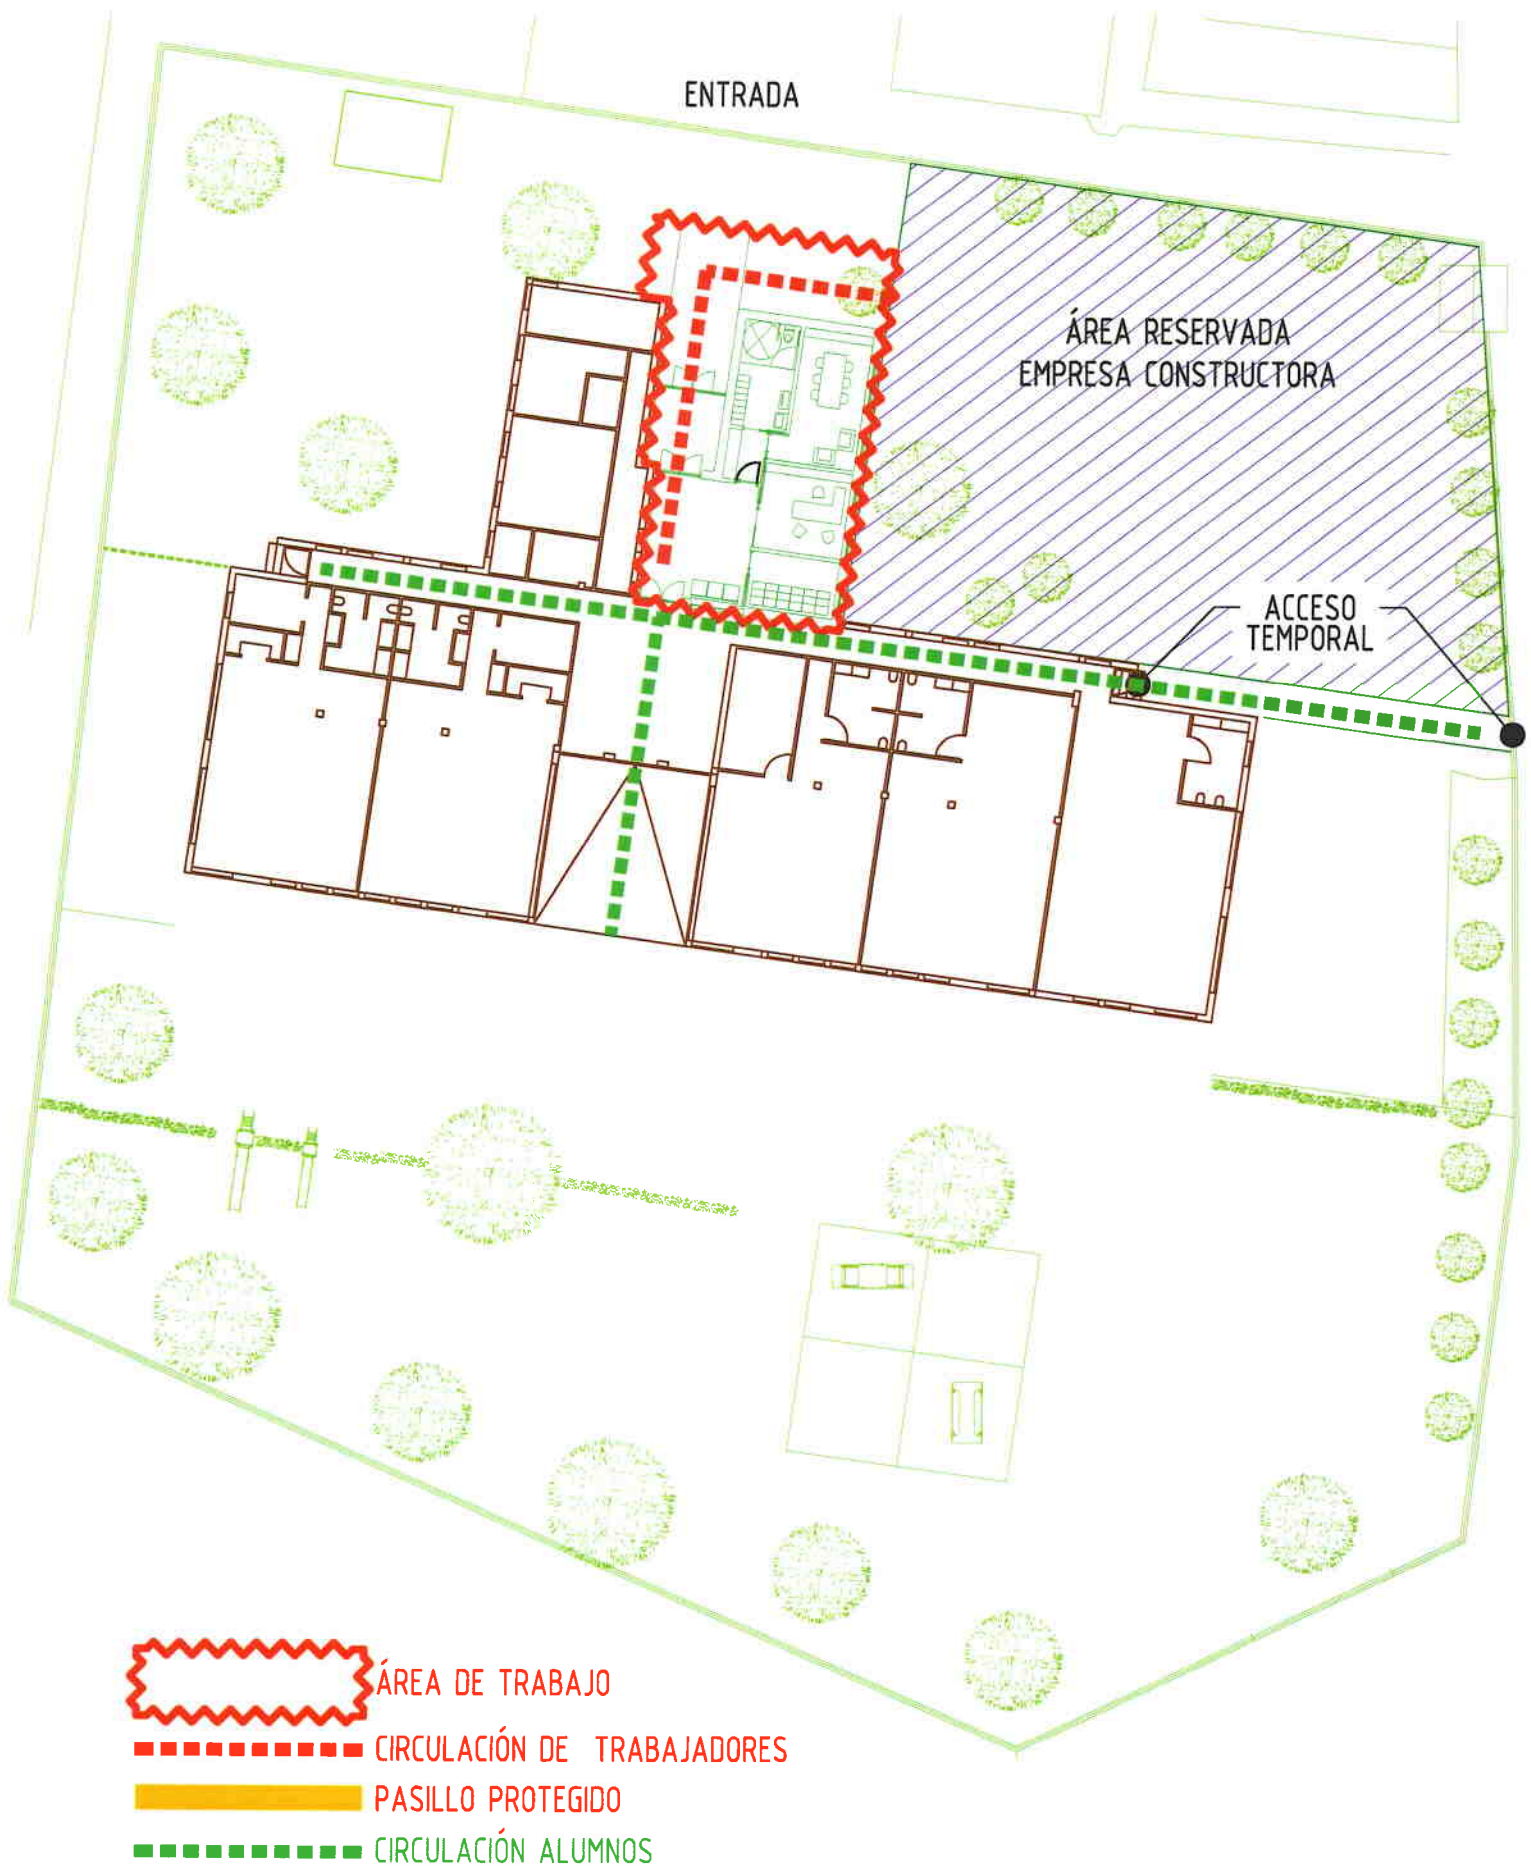


FASE 2-1

TRABAJOS EN CUBIERTA CON EL CENTRO CERRADO.

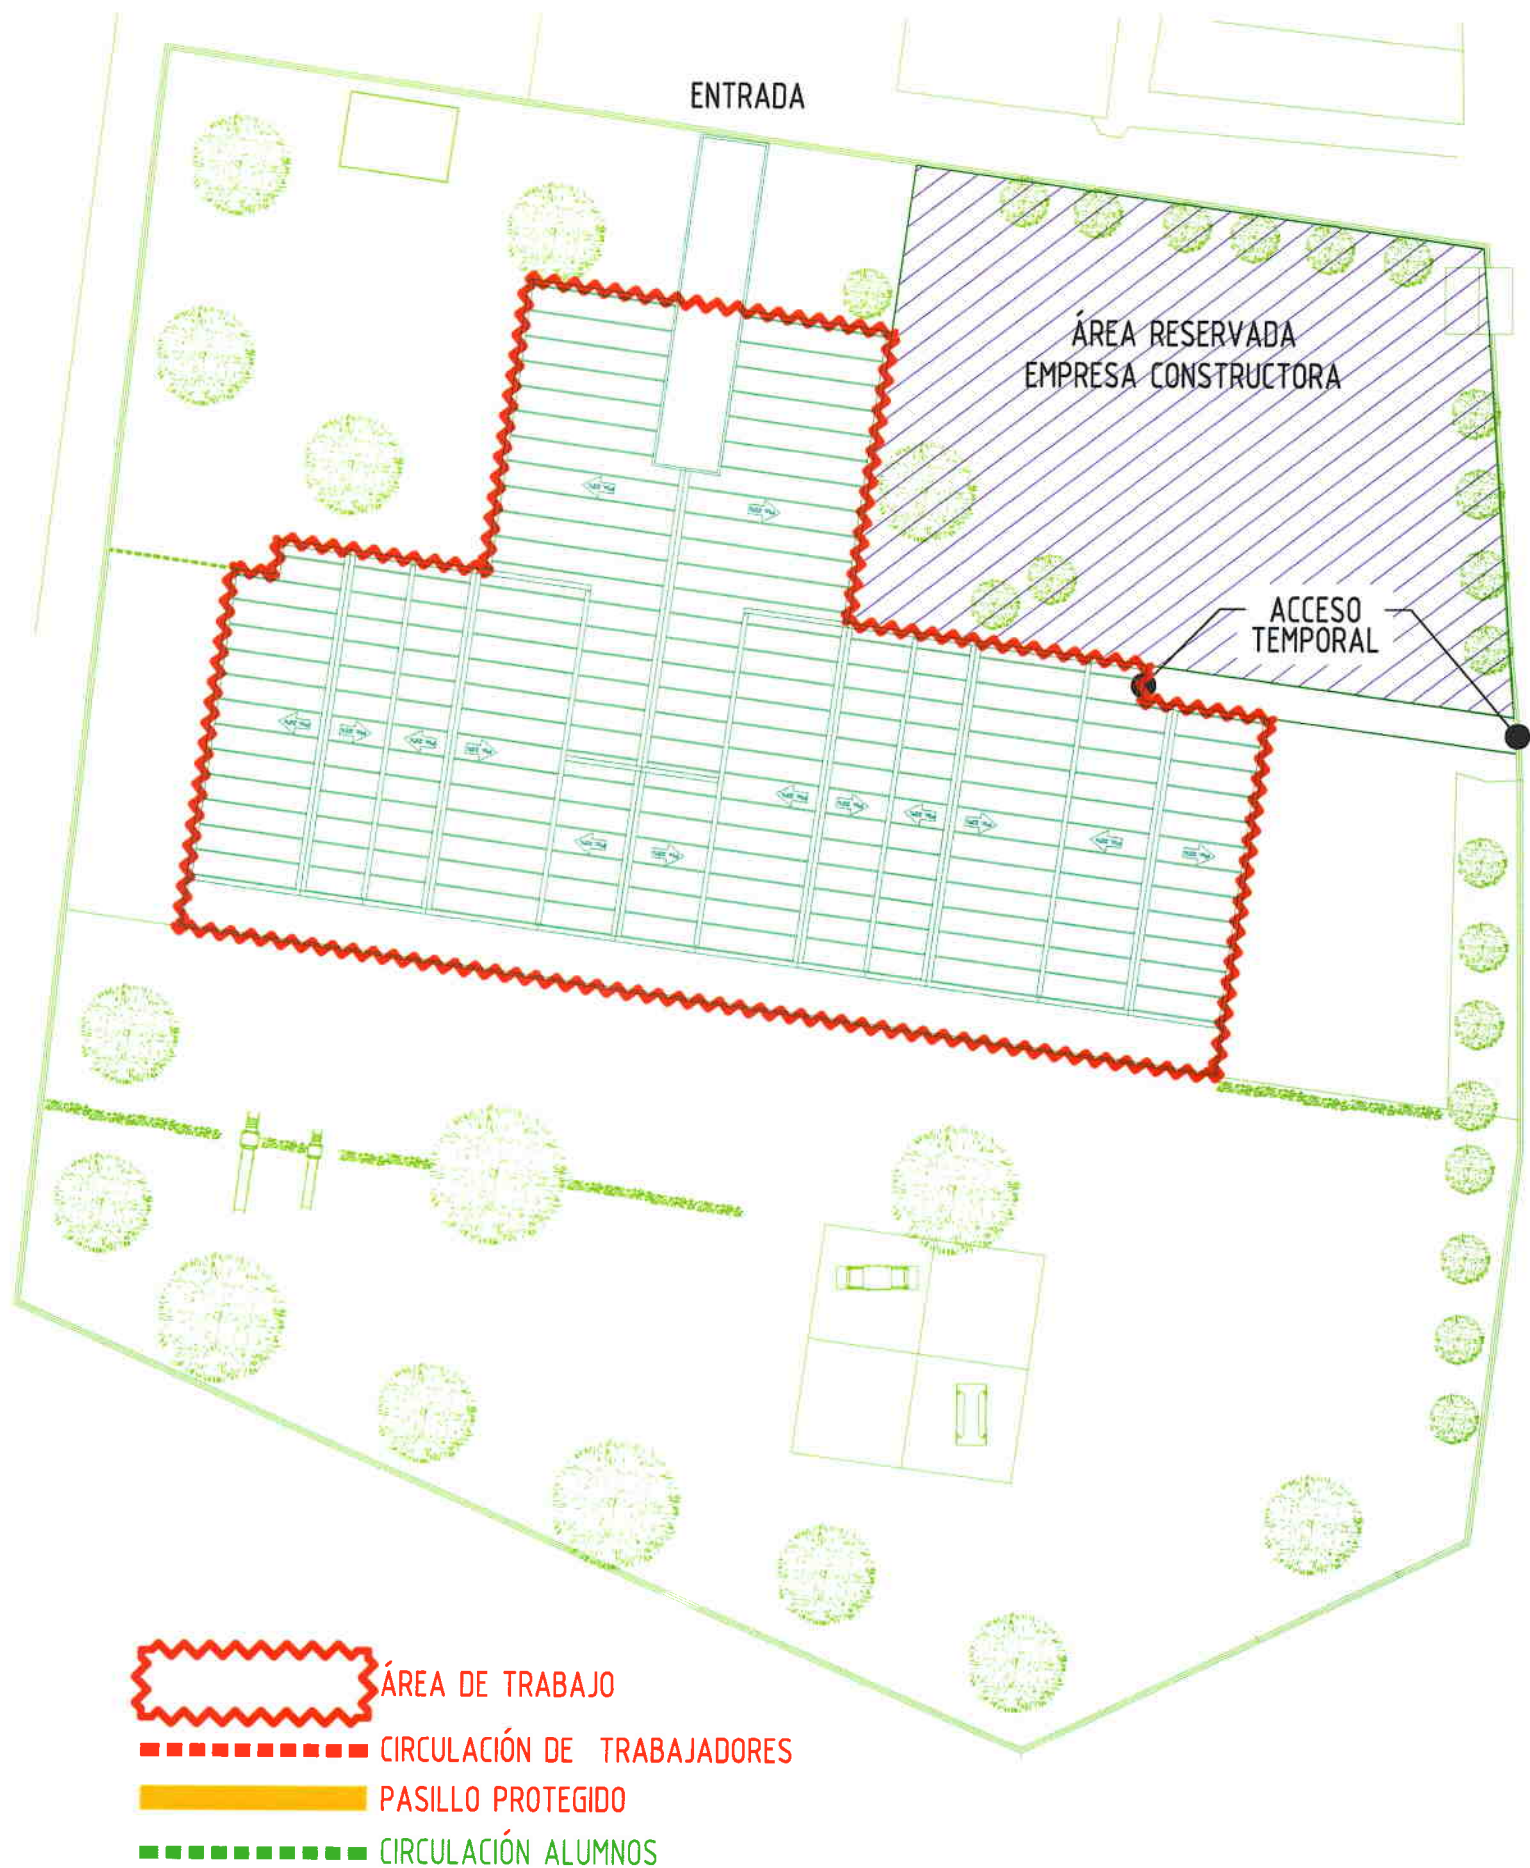


FASE 2-2

TRABAJOS INTERIORES CON EL CENTRO CERRADO.

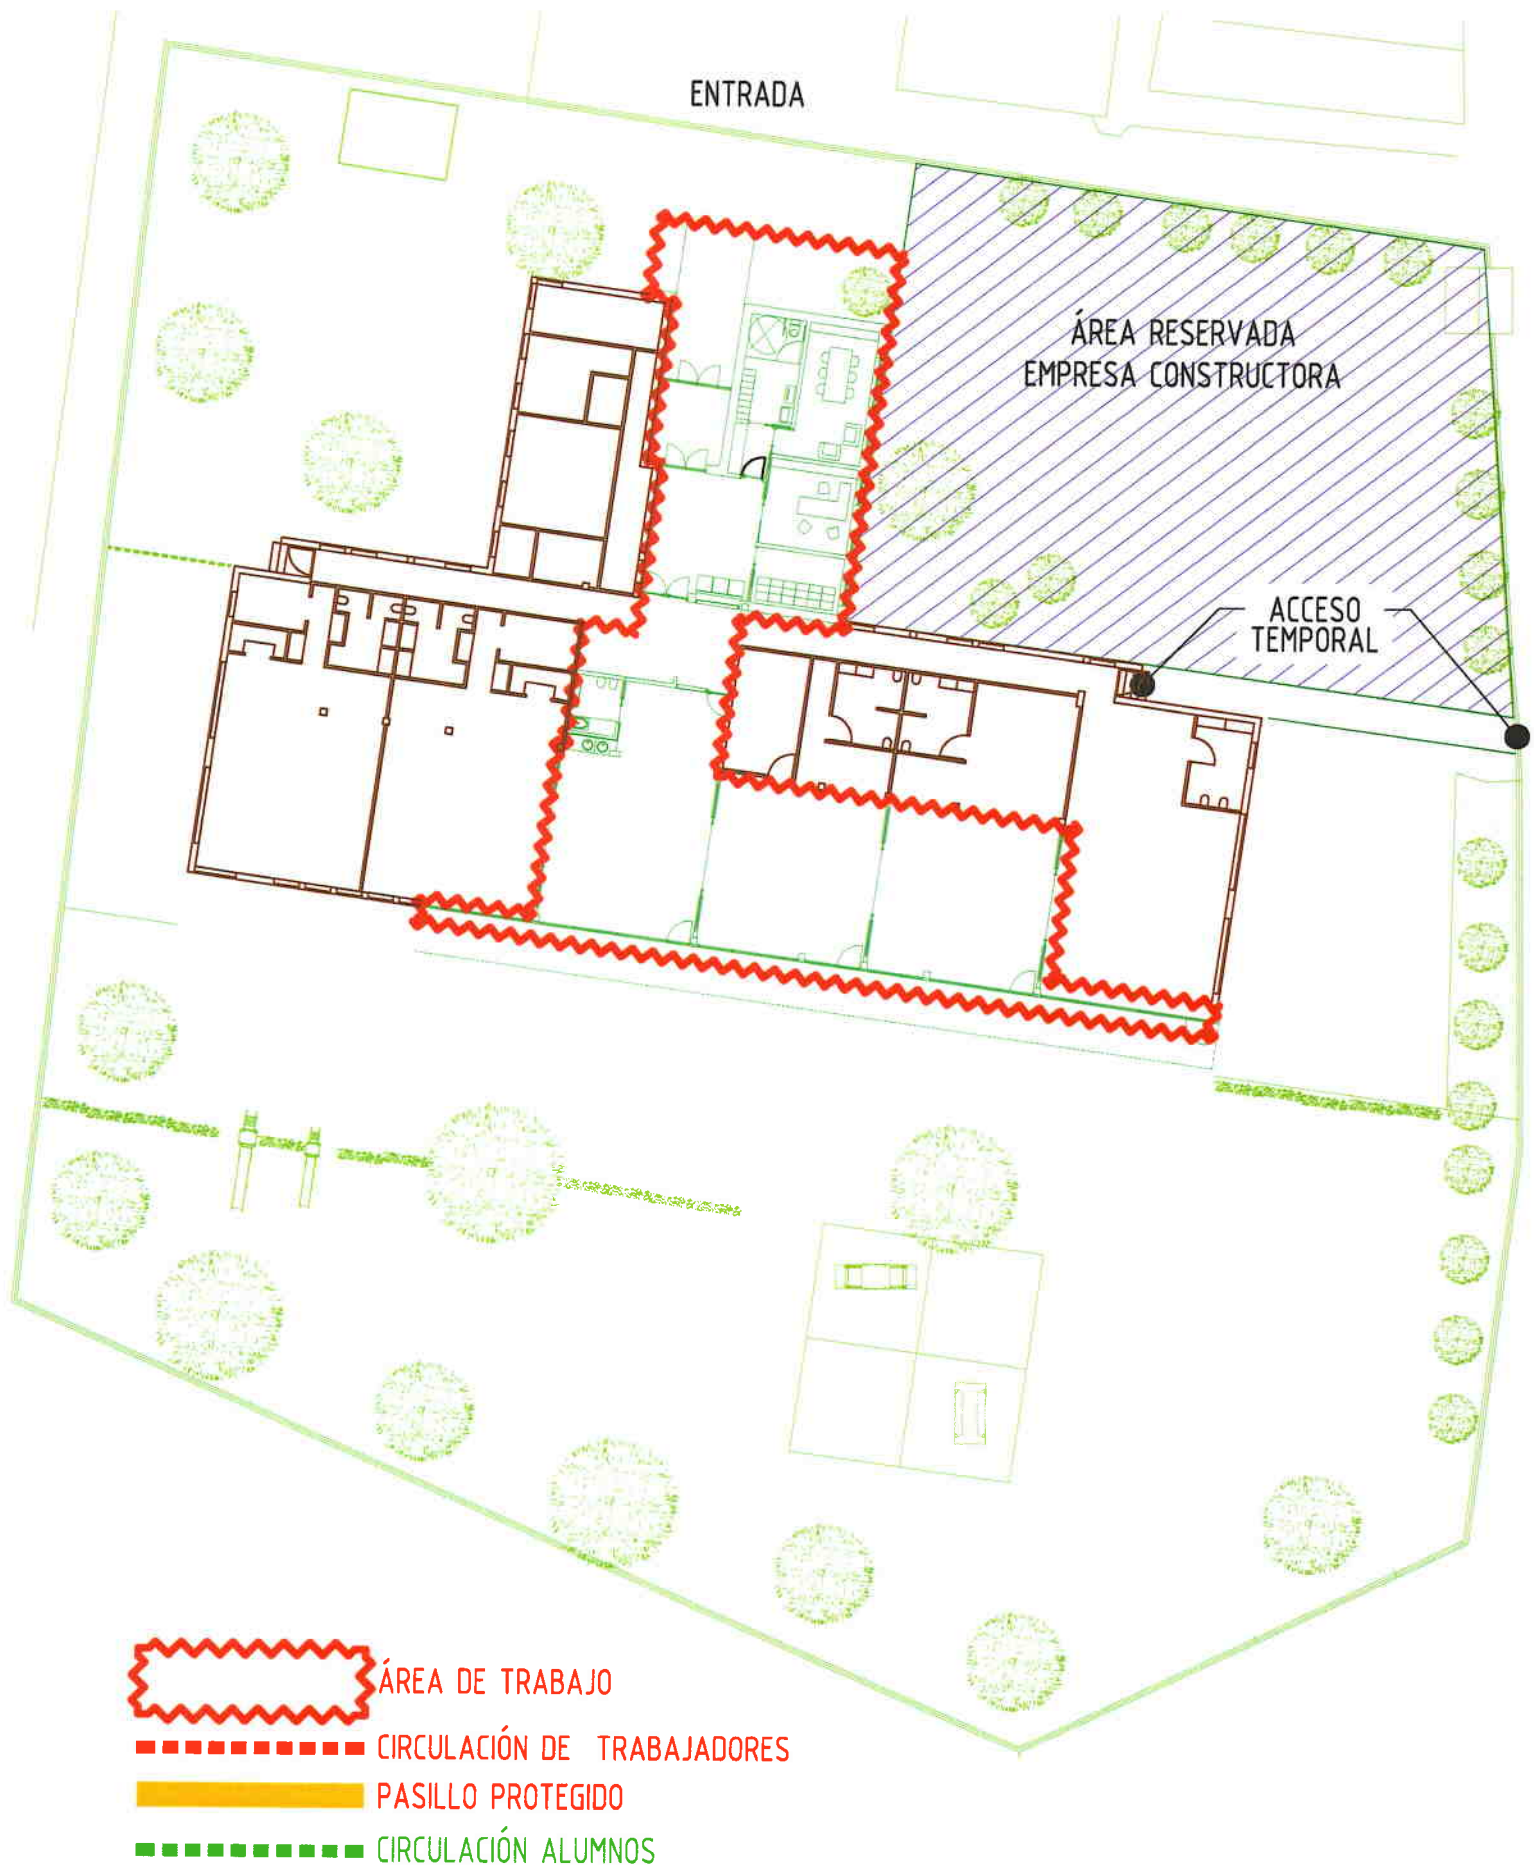

FASE 3-1

TRABAJOS INTERIORES EN AULA

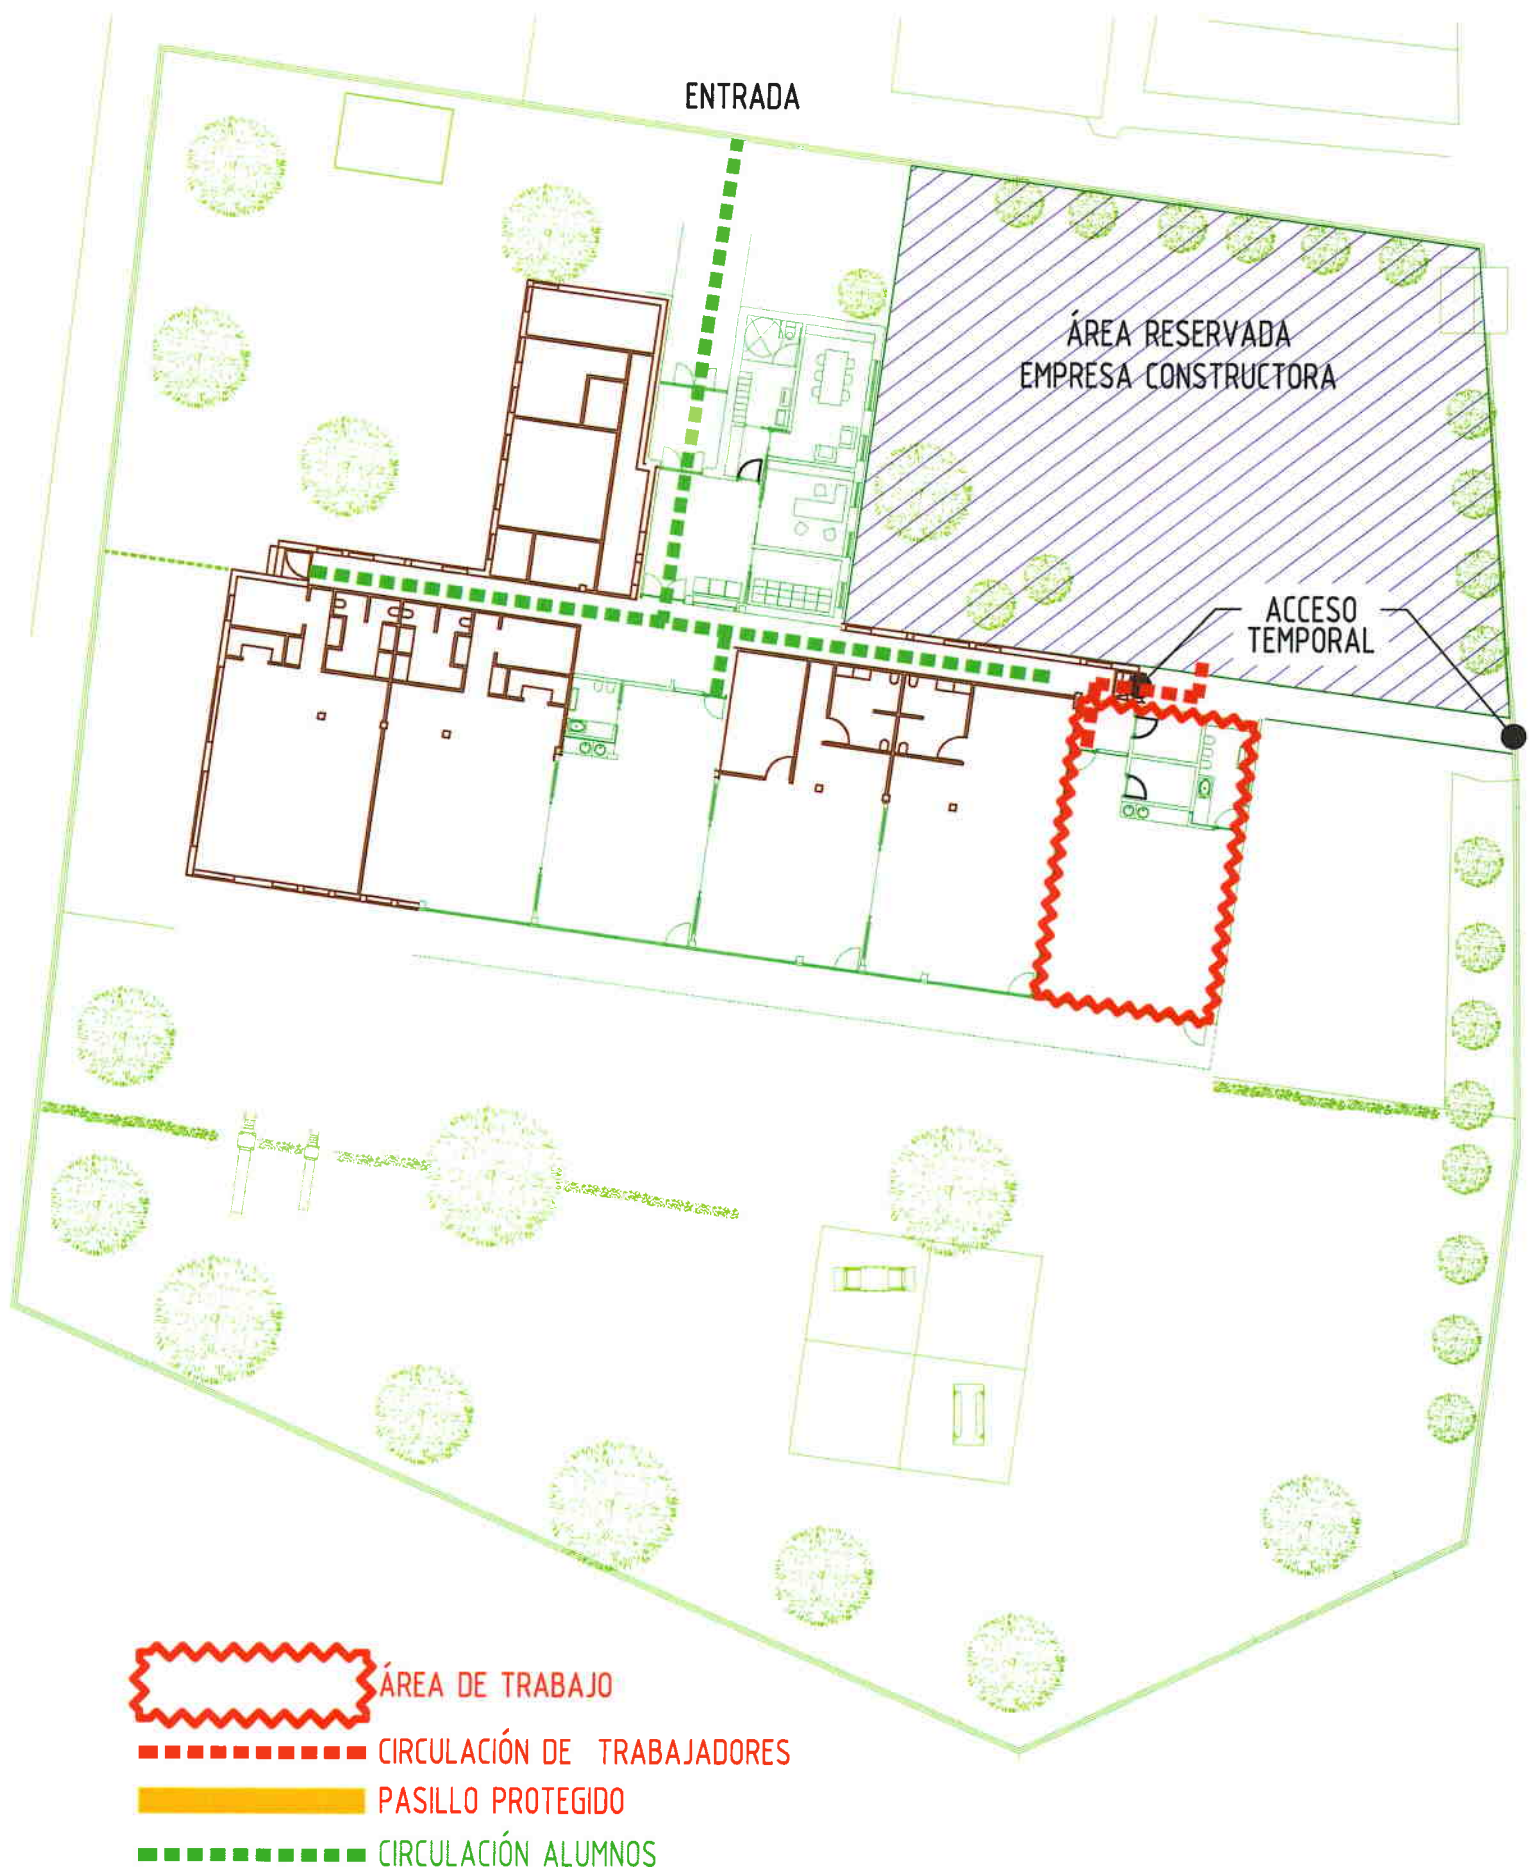

FASE 3-2

TRABAJOS INTERIORES EN AULA




FASE 3-3

TRABAJOS INTERIORES EN AULA



FASE 3-4

TRABAJOS INTERIORES EN AULA

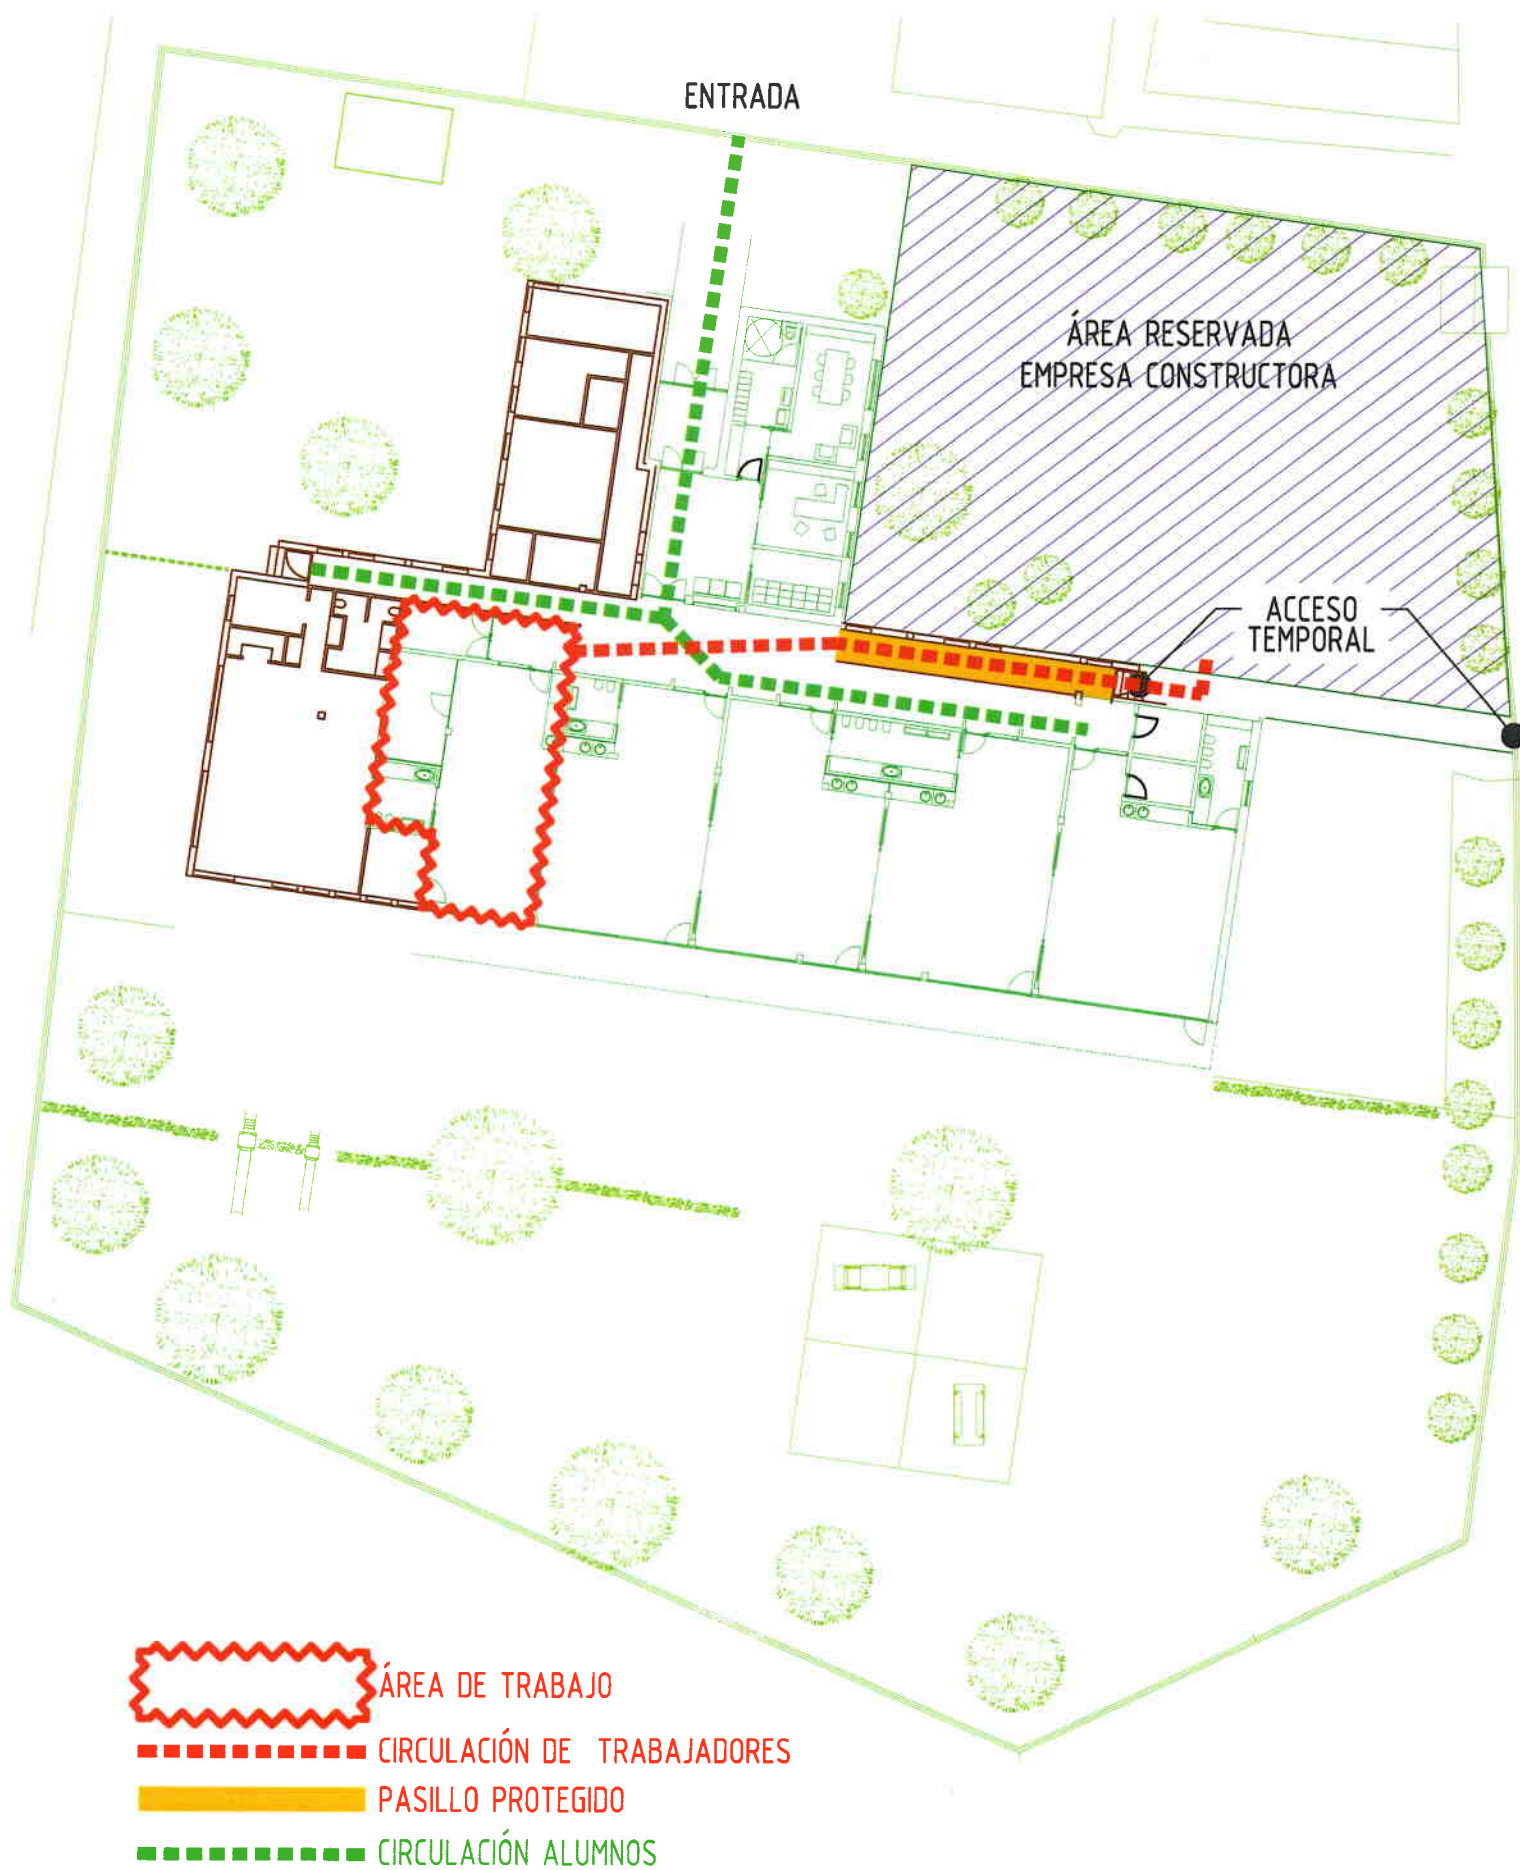

FASE 3-5

TRABAJOS INTERIORES EN AULA



FASE 3-6

TRABAJOS EN CORRECCIÓN VENTANAS EN FACHADA.




Fases I a V : Total Plazo de Ejecución de Obras 6 meses

Fase I : Cartel de obra, implantación, suministros de obra, vallados y habilitación de accesos



27 junio - 01 julio 2016

Fase II : Zona de profesores y hall-carros

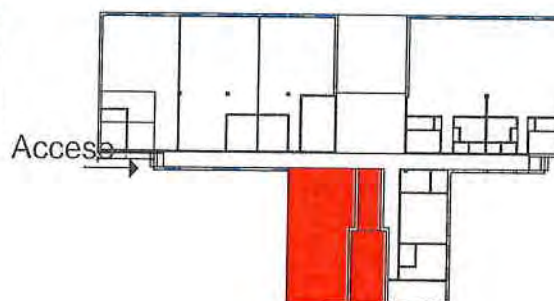


04 julio - 12 agosto 2016

C




D

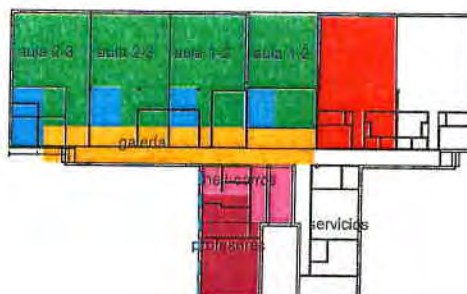

01 septiembre - 18 noviembre 2016

Fase III : Demolición y ejecución
de nuevas cubiertas
Ejecución de estructuras metálicas
de porches y cubierta.
Ejecución de acera exterior (sin
pavimento de caucho)
Aula Nueva y carpinterías fach. Sur

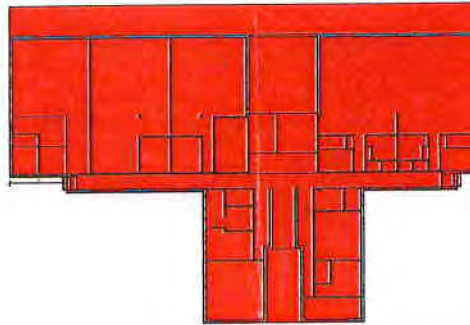

01 agosto - 31 agosto 2016

E



Fase IV : Rehabilitación de aulas
(se subdivide en 5 fases)

A



B




01 septiembre - 18 noviembre 2016

Fase V : Reforma exterior de
fachada y remate de urbanización
exterior

Desmontaje de zona de casetas y
restitución de cierres

A

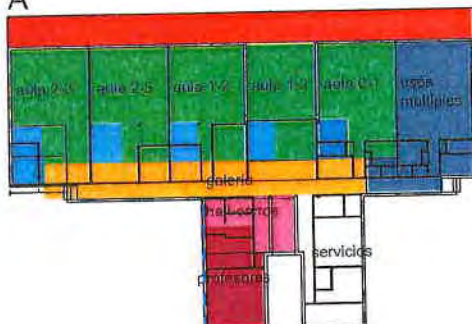

B



21 noviembre - 27 diciembre 2016



ZONA SOBRE LA QUE SE ACTÚA EN CADA
FASE DE OBRA



EN COLOR LAS ZONAS YA TERMINADAS



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE ESCUELA INFANTIL EN
O GROVE (PONTEVEDRA)

PROMOTOR

AUTOR:

FECHA JUNIO 2016

ESCALA S/E



PLANO

Nº PLANO

FASES DE OBRA
